Atelier 1 — Gestion de projet : méthodes classiques

Planification du projet « Quick Annonces » | Corrigé proposé

Document : Corrigé rédigé à partir des supports fournis

1. Hypothèses et périmètre

Quick Annonces est une application web permettant de consulter, rechercher, publier, modifier et supprimer des annonces. La planification ci-dessous est une proposition pédagogique en jours ouvrés ; elle doit être ajustée selon la taille de l'équipe, les exigences exactes et les contraintes du client.

Hypothèses : le projet démarre au jour ouvré 1 ; les développements backend et frontend peuvent être menés en parallèle après la conception ; les durées incluent le travail de l'équipe, mais pas les week-ends ni les jours fériés.

2. Décomposition des tâches (WBS) et dépendances

ID	Tâche / résultat attendu	Durée	Prédécesseur(s)
A	Cadrage, objectifs, parties prenantes et périmètre	3 j	—
B	Recueil des besoins et cahier des charges fonctionnel	3 j	A
C	Architecture, maquettes UX/UI et choix techniques	4 j	B
D	Conception détaillée : modèle de données, API et écrans	4 j	C
E	Développement backend : comptes et gestion des annonces	6 j	D
F	Développement frontend : pages, formulaires et recherche	6 j	D
G	Intégration frontend/backend et raccordement aux données	3 j	E, F
H	Tests d'intégration, tests fonctionnels et non-régression	4 j	G
I	Recette utilisateur et validation par le client	2 j	H
J	Corrections des anomalies et validation finale	3 j	I
K	Déploiement, guide utilisateur et transfert	2 j	J

Répartition indicative : le chef de projet conduit A, B et le suivi ; l'analyste et le designer contribuent à C et D ; les développeurs se répartissent E et F ; toute l'équipe participe aux tests, à la recette et à la mise en service.

3. Modèle de cycle de vie retenu : cycle en V

Le cycle en V convient à cet exercice car les phases de définition et de conception sont suivies d'une phase de réalisation, puis de niveaux de tests associés. Chaque phase doit être revue et validée avant de passer à la suivante. Les tests sont préparés à partir des exigences et de la conception.

Branche de définition / conception	Phase de vérification associée
Besoins métier et objectifs	Recette utilisateur : le produit répond-il au besoin ?
Spécifications fonctionnelles	Validation fonctionnelle du système
Architecture du système	Tests d'intégration entre les composants
Conception détaillée	Tests unitaires des composants
Codage (au fond du V)	Implémentation puis remontée par les tests

4. Diagramme PERT et calcul du chemin critique

Le PERT représente les dépendances. Les tâches E (backend) et F (frontend) démarrent ensemble après D et doivent toutes deux être terminées avant l'intégration G.

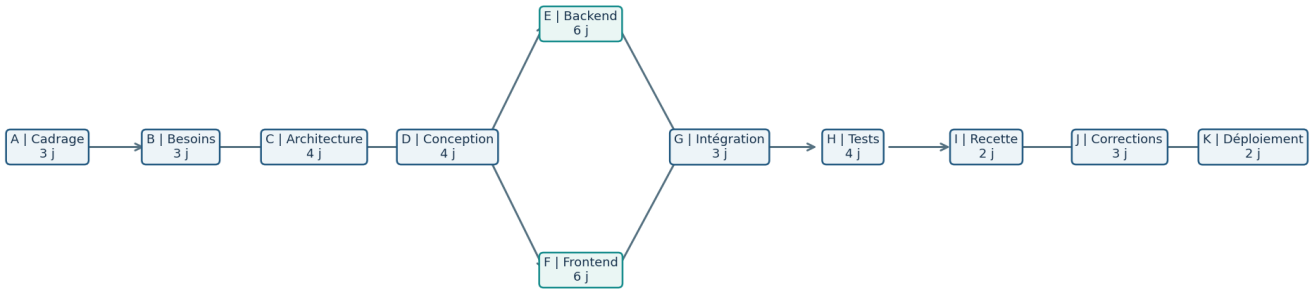


Figure 1 — Réseau des tâches (durées en jours ouvrés). E et F sont parallèles.

Calcul des dates au plus tôt et au plus tard

ID	Durée	Au plus tôt (début-fin)	Au plus tard (début-fin)	Marge
A	3	0–3	0–3	0
B	3	3–6	3–6	0
C	4	6–10	6–10	0
D	4	10–14	10–14	0
E	6	14–20	14–20	0
F	6	14–20	14–20	0
G	3	20–23	20–23	0
H	4	23–27	23–27	0
I	2	27–29	27–29	0
J	3	29–32	29–32	0
K	2	32–34	32–34	0

Durée totale estimée : 34 jours ouvrés. Les deux chemins critiques ont la même durée : A-B-C-D-E-G-H-I-J-K et A-B-C-D-F-G-H-I-J-K. Toutes les tâches ont une marge nulle dans ce planning simplifié ; tout retard sur une tâche critique retarde la fin du projet.

5. Diagramme de Gantt

Le Gantt ci-dessous place les tâches sur l'axe du temps. Les barres E et F se chevauchent car le backend et le frontend sont développés en parallèle.

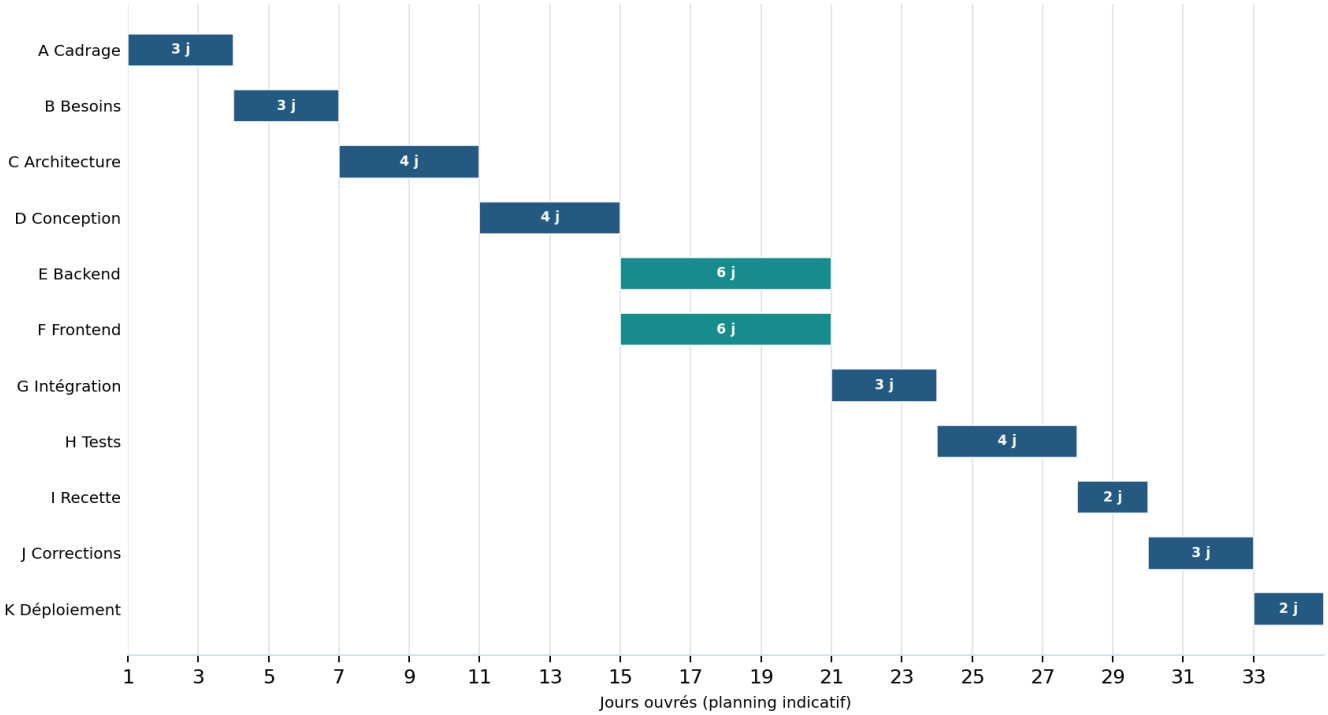


Figure 2 — Calendrier indicatif ; les numéros de jours sont des jours ouvrés relatifs au démarrage.

6. Contrôle et risques à suivre

- **Risque de besoins incomplets :** faire valider le cahier des charges avant la conception.
- **Risque d'intégration :** définir tôt les contrats d'API et partager des données de test entre les développeurs.
- **Risque de dépassement :** suivre chaque semaine le réalisé par rapport au Gantt et réestimer si une tâche dérive.
- **Critères d'acceptation :** une annonce peut être créée, affichée dans la liste, recherchée et consultée dans sa fiche ; les actions de modification/suppression respectent les droits prévus.
- **Limite du modèle :** les durées sont des estimations ; une équipe plus nombreuse, des exigences de sécurité ou une authentification complète peuvent modifier le calendrier.

Conclusion

Cette planification relie les tâches par leurs dépendances, indique deux chemins critiques et propose un calendrier initial. Le chef de projet devra mettre à jour les durées, les responsables et le Gantt en fonction de l'avancement réel.
